ARKITEMA ARCHITECTS

NYE PLEJEBOLIGER - PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN DRAGØR - ETAPE III

Proces- og tidsplan
pr. 23.06.2011

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1				
2	**KAB:**	1 dag?	ma 29-11-10	ma 29-11-10
3	Udfærdigelse af Skema A	17 dage?	ma 29-11-10	ti 21-12-10
4	Udfærdigelse af Skema B	15 dage	ma 22-08-11	fr 09-09-11
5	Kontrahering (betinget af skema B)	1 dag	fr 14-10-11	fr 14-10-11
6				
7				
8	**Dragør Kommune:**	1 dag?	on 22-12-10	on 22-12-10
9	Skema A - behandling i udvalg, godkendelse kommunalbestyrelse	27 dage	on 22-12-10	to 27-01-11
10	Godkendelse af projektmateriale inden udbud	1 dag?	ma 20-06-11	ma 20-06-11
11	Skema B - behandling i udvalg, godkendelse kommunalbestyrelse	24 dage	ma 12-09-11	to 13-10-11
12				
13				
14	**Arkitema:**	**1 dag?**	**ma 01-11-10**	**ma 01-11-10**
15	Planer og facader samt arealoversigt	15 dage?	on 01-12-10	ti 21-12-10
16	Udbudsmateriale	43 dage	on 20-04-11	fr 17-06-11
17	Indbydelse af entreprenører	10 dage	on 25-05-11	ti 07-06-11
18	Udsendelse til entreprenører = tilbudsperiode	40 dage	fr 24-06-11	to 18-08-11
19	Licitation	1 dag?	fr 19-08-11	fr 19-08-11
20	Standstill	15 dage	ma 22-08-11	fr 09-09-11
21				
22				
23	**Totalentreprenør:**	**479 dage?**	**on 01-12-10**	**ma 01-10-12**
24	Byggeri etape I	174 dage	on 01-12-10	ma 01-08-11
25	Byggeri etape II	218 dage?	on 01-06-11	fr 30-03-12
26	Udflytning Drogden (til etape I)	21 dage	to 01-09-11	to 29-09-11
27	Drogden: Planlægning/nedrivning/byggeri - 1.del etape III (10 mdr.)	219 dage	ma 03-10-11	to 02-08-12
28	Udflytning Røsen (til etape 2 (eller etape 1?))	21 dage	ma 02-04-12	ma 30-04-12
29	Røsen: Planlægning/nedrivning/byggeri - 2.del etape III (10 mdr.)	110 dage	ti 01-05-12	ma 01-10-12

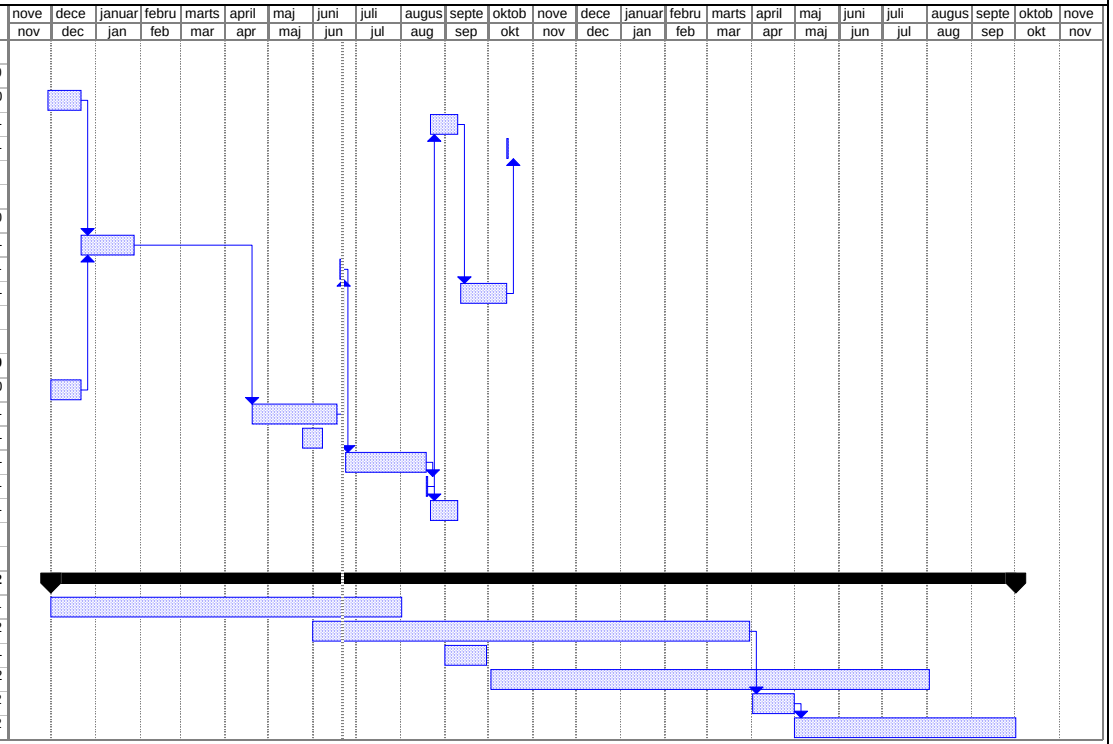

Opgave
Opdeling
Fremdrift
Milepæl
Oversigt
Projektoversigt
Eksterne opgaver
Ekstern milepæl
Deadline
