Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
0	**Lejerbo Køge Bugt - Udbudstidsplan 12.10.2011**	**405 dage**	**to 13-10-11**	**on 01-05-13**
1	Myndighedsbehandling	87 dage	ti 01-11-11	on 29-02-12
2	Tilbudsperiode	29 dage	to 13-10-11	ti 22-11-11
3	Licitation	1 dag	ti 22-11-11	ti 22-11-11
4	Valg af entreprenør	7 dage	ti 22-11-11	on 30-11-11
5	Stand still periode	8 dage	to 01-12-11	lø 10-12-11
6	indsendelse af skema B	1 dag	to 01-12-11	to 01-12-11
7	Godkendelse af skema B	1 dag	ti 06-12-11	ti 06-12-11
8	Nedbrydning /Forureningsoprensning	67 dage	to 12-01-12	fr 13-04-12
9	Hovedprojekt	22 dage	ma 02-01-1	ti 31-01-12
10	granskning af projekt	11 dage	on 01-02-12	on 15-02-12
11	Etablering af byggeplads	15 dage	ma 02-04-12	fr 20-04-12
12	Udførelse	269 dage	fr 20-04-12	on 01-05-13
13	Mangelgennemgang	5 dage	ma 01-04-1	fr 05-04-13
14	Mangelafhjælpning	10 dage	ma 08-04-1	fr 19-04-13
15	Slutrengøring	7 dage	ma 22-04-1	ti 30-04-13
16	Aflevering til bygherren	1 dag	on 01-05-13	on 01-05-13

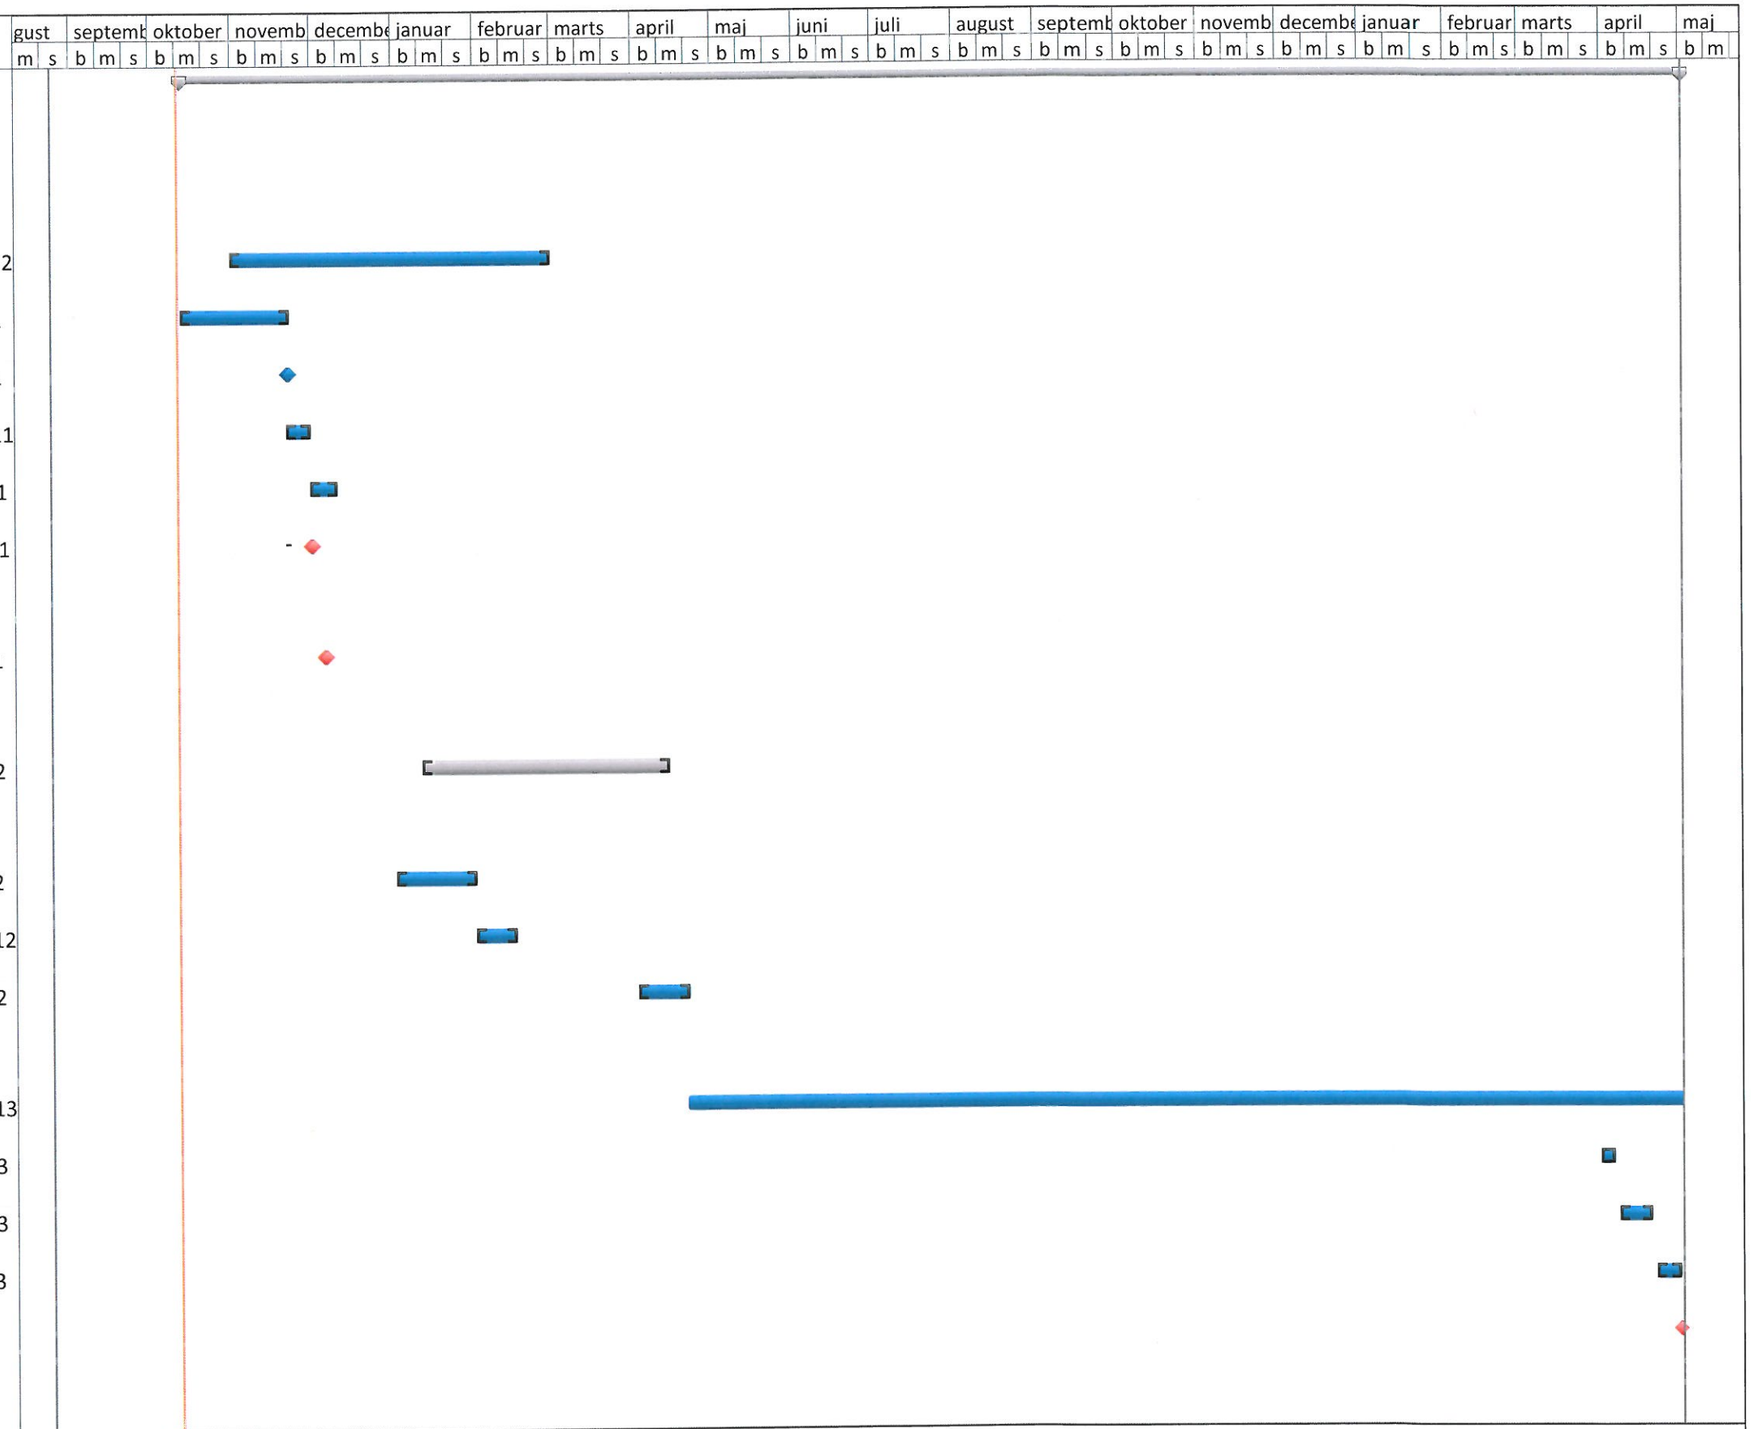
gust
septemb
oktober
novemb
decembe
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
septemb
oktober
novemb
decembe
januar
februar
marts
april
maj
m s b m s b m s b
